
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало
1	**График постройки круизного судна "Волжский Горизонт"**	**957 дней**	**22.09.2026**
2	**1. Предпроектные работы**	**2 дней**	**22.09.2026**
3	1.1. Получение ТЗ от Заказчика	2 дней	22.09.2026
4	1.2. Проработка ТЗ в ПБ "Без Границ"	2 дней	22.09.2026
5	1.3. Анализ текущих мощностей АО "адмиралтейские верфи"	2 дней	22.09.2026
6	**2. Маркетинг**	**10 дней**	**24.09.2026**
7	2.1. Маркетинговый анализ рынка речных ресурсов	3 дней	24.09.2026
8	2.2. Разработка стратегии конкурентоспособности	7 дней	29.09.2026
9	**3. Дизайн и проектирование**	**66 дней**	**08.10.2026**
10	3.1. Эскизирование	31 дней	08.10.2026
11	3.2. Прототипирование и НИР (расчёты по теории корабля, ходкости, остойчивости и прочности)	31 дней	08.10.2026
12	3.3. Разработка дизайна	35 дней	20.11.2026
13	3.4. ОКР (опытно-конструкторская работа	35 дней	20.11.2026
14	**4. Согласование технического проекта с Российским Речным Регистром**	20 дней	08.01.2027
15	**5. Экономика и договорная работа**	**25 дней**	**08.01.2027**
16	5.1. Расчёт ориентировочной стоимости	15 дней	08.01.2027
17	5.2. Согласование ОЦ и ТЗ с заказчиком	5 дней	29.01.2027
18	5.3. Оформление и подписание договора	5 дней	05.02.2027
19	**6. Составление рабочей конструкторской документации (схемы систем, чертежи оборудования)**	116 дней	08.01.2027
20	**7. Материально-техническое обеспечение**	**120 дней**	**21.06.2027**
21	7.1. Формирование спецификаций и заявок на закупку	30 дней	21.06.2027
22	7.2. Заключение договоров с поставщиками (включая длинноцикловые позиции: ГДГ, ГЭД,	45 дней	02.08.2027
23	7.3. Поставка материалов и входной контроль качества	45 дней	04.10.2027
24	**8. Подготовка производства**	**66 дней**	**21.06.2027**
25	8.1. Составление графика строительства	10 дней	21.06.2027
26	8.2. Распределение графиков строительства между ОПЦ	6 дней	05.07.2027
27	8.3. Составление и расчёт тех.нарядов согласно графикам	15 дней	13.07.2027
28	8.4 Проектирование и изготовление оснастки	28 дней	03.08.2027
29	8.5. Внедрение производственной систем	7 дней	10.09.2027
30	**9. Персонал**	**104 дней**	**05.07.2027**
31	9.1. Разработка системы оплаты труда и мотивации	49 дней	05.07.2027
32	9.2. Формирование проектной группы	43 дней	03.08.2027
33	9.3. Обучение персонала	40 дней	01.10.2027



Ид.	Название задачи	Длительность	Начало
34	**10. Постройка проекта**	**422 дней**	**01.10.2027**
35	10.1. Корпусообработка, изготовление деталей	183 дней	01.10.2027
36	10.2. Сборка и сварка секций и блоков	183 дней	01.10.2027
37	10.3. Выполнение работ на стапеле	183 дней	14.06.2028
38	10.4. Изготовление изделий МСЧ	257 дней	01.10.2027
39	**Закладка киля**	0 дней	25.09.2028
40	10.5. Формирование корпуса на стапеле	165 дней	26.09.2028
41	10.6. Монтаж механизмов и трудопроводов на стапеле	100 дней	26.09.2028
42	10.7. Трубомонтаж на стапеле	100 дней	26.09.2028
43	Спуск на воду	0 дней	12.02.2029
44	**11. Выполнение работ на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделочные работы, пуско-наладочные работы**	274 дней	13.02.2029
45	12. Проведение швартовных и заводских испытаний	22 дней	04.03.2030
46	13. Устранение ошибок по результатам испытаний	28 дней	03.04.2030
47	**14. Освидетельствование судна РРР (выдача классификационного**	11 дней	03.04.2030
48	**15. Передача заказчику**	**25 дней**	**18.04.2030**
49	15.1. Формирование и подписание акта сдачи-приёма выполненных работ	25 дней	18.04.2030
50	**Судно передано заказчику**	**0 дней**	**22.05.2030**
51	**Сервисное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств**	522 дней	23.05.2030
52	**Утилизация (после окончания срока эксплуатации)**	365 дней	23.05.2075

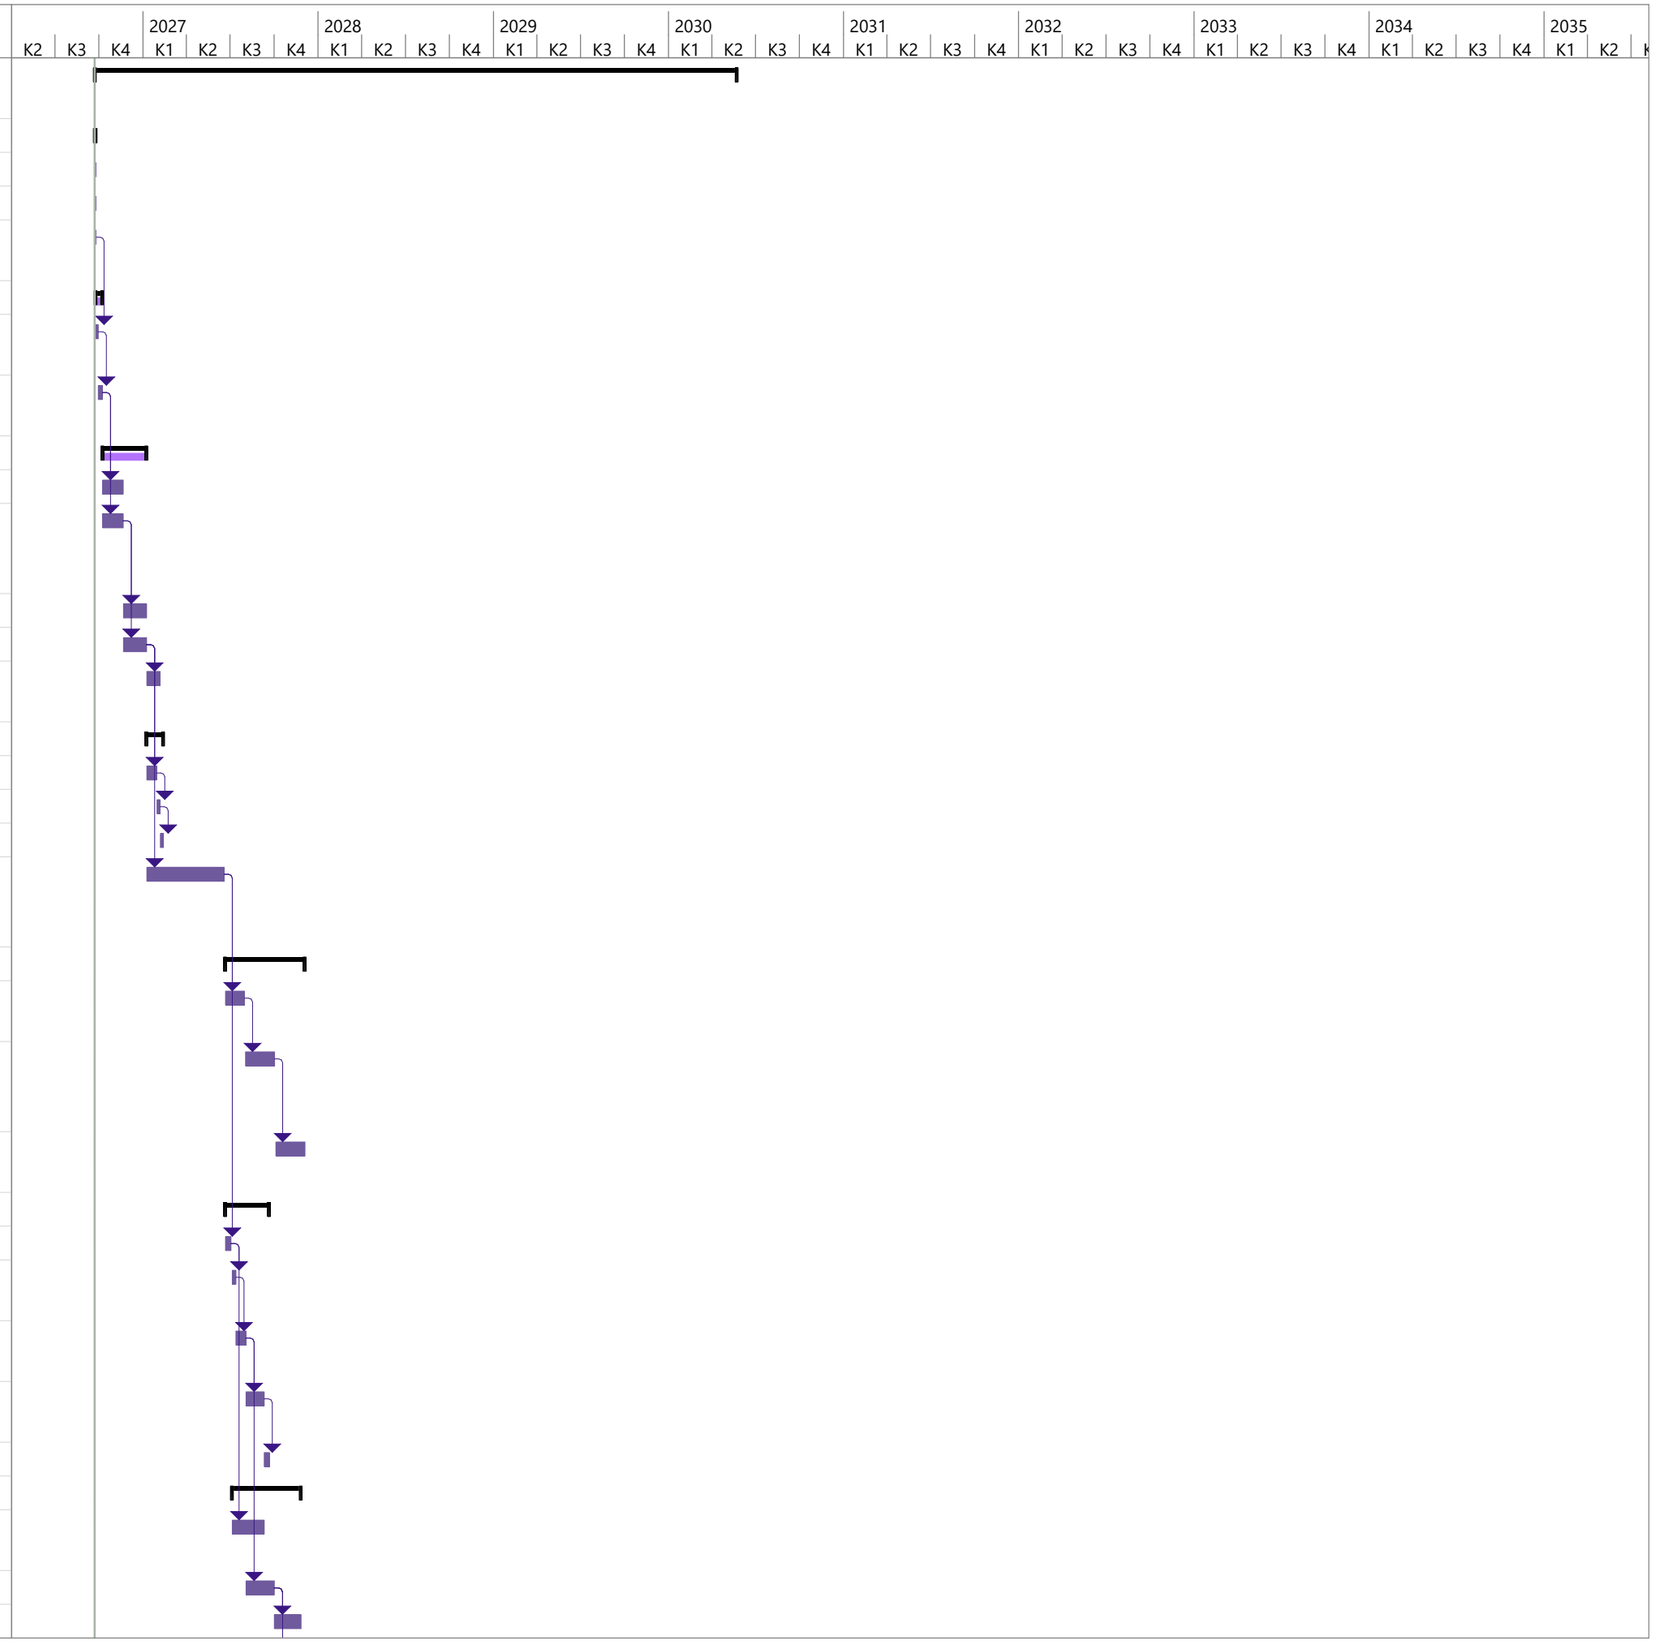
