
Ид.	Название задачи	Длительность	Начало
1	**График постройки круизного судна "Волжский Горизонт"**	**968 дней**	**22.09.2026**
2	**1. Предпроектные работы**	**2 дней**	**22.09.2026**
3	1.1. Получение ТЗ от Заказчика	2 дней	22.09.2026
4	1.2. Проработка ТЗ в ПБ "Без Границ"	2 дней	22.09.2026
5	1.3. Анализ текущих мощностей АО "Адмиралтейские верфи"	2 дней	22.09.2026
6	**2. Маркетинг**	**10 дней**	**24.09.2026**
7	2.1. Маркетинговый анализ рынка речных ресурсов	3 дней	24.09.2026
8	2.2. Разработка стратегии конкурентоспособности	7 дней	29.09.2026
9	**3. Дизайн и проектирование**	**66 дней**	**08.10.2026**
10	3.1. Эскизирование	31 дней	08.10.2026
11	3.2. Прототипирование и НИР (расчёты по теории корабля, ходкости, остойчивости и прочности)	31 дней	08.10.2026
12	3.3. Разработка дизайна	35 дней	20.11.2026
13	3.4. ОКР (опытно-конструкторская работа)	35 дней	20.11.2026
14	**4. Согласование технического проекта с Российским Речным Регистром**	20 дней	08.01.2027
15	**5. Экономика и договорная работа**	**25 дней**	**08.01.2027**
16	5.1. Расчёт ориентировочной стоимости	15 дней	08.01.2027
17	5.2. Согласование ОЦ и ТЗ с заказчиком	5 дней	29.01.2027
18	5.3. Оформление и подписание договора	5 дней	05.02.2027
19	**6. Составление рабочей конструкторской документации (схемы систем, чертежи оборудования)**	116 дней	08.01.2027
20	**7. Подготовка производства**	**66 дней**	**21.06.2027**
21	7.1. Составление графика строительства	10 дней	21.06.2027
22	7.2. Распределение графиков строительства между ОПЦ	6 дней	05.07.2027
23	7.3. Составление и расчёт тех.нарядов согласно графикам	15 дней	13.07.2027
24	7.4 Проектирование и изготовление оснастки	28 дней	03.08.2027
25	7.5. Внедрение производственной системы	7 дней	10.09.2027
26	**8. Материально-техническое обеспечение**	**280 дней**	**05.07.2027**
27	8.1. Формирование спецификаций и заявок на закупку	30 дней	05.07.2027
28	8.2. Заключение договоров с поставщиками (включая длинноцикловые позиции: ГДГ, ГЭД, колёса с приводами)	45 дней	16.08.2027
29	8.3. Поставка металла и материалов, входной контроль качества	45 дней	18.10.2027
30	8.4 Поставка длинноцикловых позиций: ГДГ, ГЭД, колёса с приводами, батарея	205 дней	18.10.2027
31	**9. Персонал**	**104 дней**	**05.07.2027**
32	9.1. Разработка системы оплаты труда и мотивации	49 дней	05.07.2027



Ид.	Название задачи	Длительность	Начало
33	9.2. Формирование проектной группы	43 дней	03.08.2027
34	9.3. Обучение персонала	40 дней	01.10.2027
35	**10. Постройка проекта**	**425 дней**	**01.10.2027**
36	10.1. Корпусообработка, изготовление деталей	183 дней	01.10.2027
37	10.2. Сборка и сварка секций и блоков	183 дней	01.10.2027
38	10.4. Изготовление изделий МСЧ	257 дней	01.10.2027
39	**Закладка киля**	0 дней	25.09.2028
40	10.5. Выполнение работ на стапеле	168 дней	26.09.2028
41	10.6. Формирование корпуса на стапеле	159 дней	26.09.2028
42	10.7. Монтаж механизмов и трудопроводов на стапеле	94 дней	26.09.2028
43	10.8. Трубомонтаж на стапеле	94 дней	26.09.2028
44	**Спуск на воду**	0 дней	02.02.2029
45	**11. Выполнение работ на достроечной набережной (монтаж оборудования и систем, отделочные работы, пуско-наладочные работы**	274 дней	05.02.2029
46	**12. Проведение швартовных испытаний**	14 дней	22.02.2030
47	**13. Устранение ошибок по результатам швартовных испытаний**	18 дней	14.03.2030
48	**14. Проведение заводских ходовых испытаний**	7 дней	09.04.2030
49	**15. Устранение ошибок по результатам испытаний**	28 дней	18.04.2030
50	**16. Освидетельствование судна РРР (выдача классификационного**	11 дней	18.04.2030
51	**17. Передача заказчику**	**25 дней**	**03.05.2030**
52	17.1. Формирование и подписание акта сдачи-приёма выполненных работ	25 дней	03.05.2030
53	**Судно передано заказчику**	**0 дней**	**06.06.2030**
54	**Сервисное обслуживание и выполнение гарантийных обязательств**	522 дней	07.06.2030
55	**Утилизация (после окончания срока эксплуатации)**	365 дней	24.05.2055

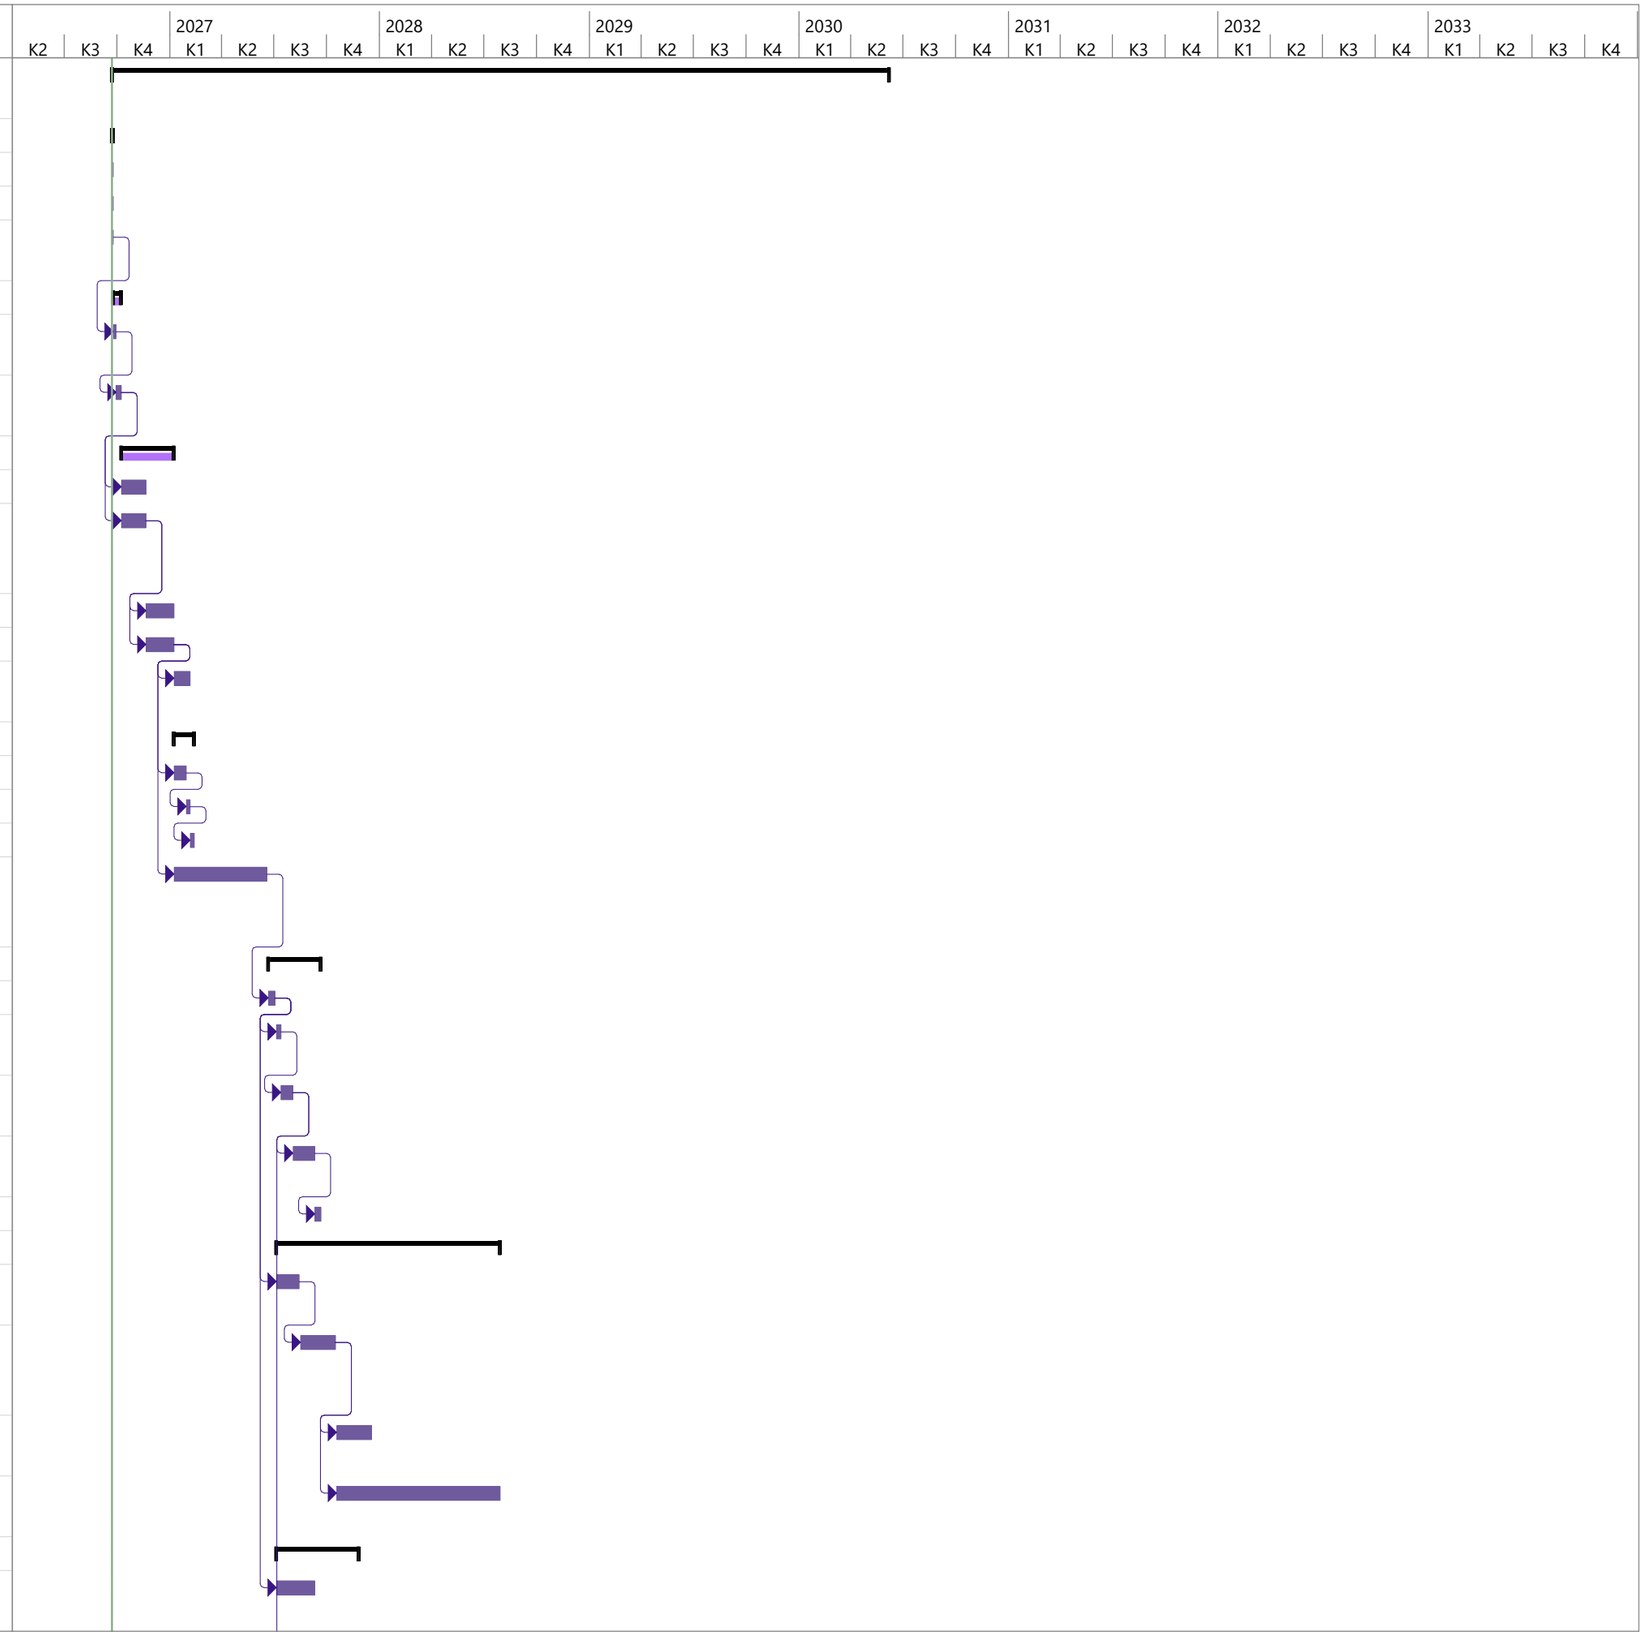
